


✓ **Verifica differenziale**



Periodicità  
**SEMESTRALE**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:  
usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, da luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

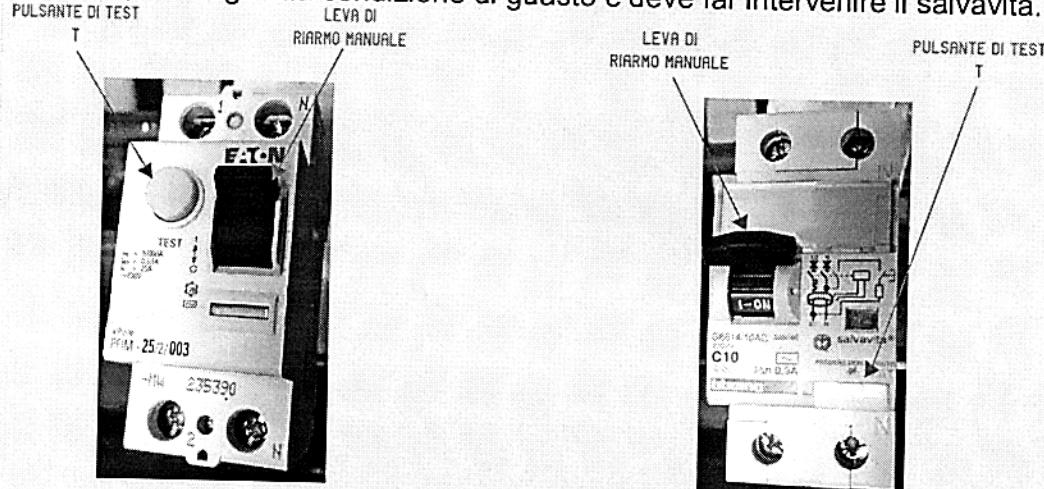

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
14/01/22	Pos.	Brec Seaglion	NO	14/02/22	Sy

✓ **Verifica visuale stato impianto elettrico**



Periodicità  
**SEMESTRALE**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ **Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.)**
- ✓ **Stato di eventuali cavi elettrici se a vista**
- ✓ **Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche)**
- ✓ **Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico**

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
14/01/22	Pos.	Brec Seaglion	NO	14/02/22	Sy




Periodicità  
**SEMESTRALE**

✓ **Sorveglianza luci di emergenza**

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ **Prima di tutto** dovrà prestare particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
    - ✓ **Verificare l'efficienza dell'intervento automatico**, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
    - ✓ **Verificare che non presentino evidenti difetti**
    - ✓ **Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento**

Nº



DATA	REGISTRO	INCARICATO	NON CONFORM.	PROSSIMA V. RIF.	FINITA
14/01/22	Pos.	Bice SCAGLIONE	NO	14/01/22	S

~~BTEC srl  
Via Lombarda, 217 Tel. 0583-436029  
LAMMATH - LUCCA  
P. IVA e C.F. 01800430462~~
